



तानसेन नगरपालिका पाल्पा

बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. २०८०/०८१)



स्रोत: नेपालका नक्सा (स्केल १:१०,००,०००-१:२०,००,०००), मापन विभाग र जनसङ्ख्या २०६८, कोषिय सङ्ग्रह विभाग
नक्सा पाठ: नगरपालिका, नगरपालिका तथा विभिन्न, नक्साको मापनले देखाएको नक्सा तथा सीमाना निर्माण गरिएको

Projection System: MJTM, Spheroid - Everest 1830
LLRC, 2018

पहाडकी रानी बादल माथिको शहर



तानसेन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय





Tansen, Bazar, View from telgha, Palpa

© Teknanyan Bhattacharya (71-5557060266)

तानसेन नगरपालिका
लुम्बिनी प्रदेश कै
ऐतिहासिक, धार्मिक,
पर्यटकीय दृष्टिले
प्रसिद्ध र अत्यन्त
रमणीय क्षेत्रको रुपमा
रहेको छ ।

यसको भौगोलिक
अवस्थिति 27.40° उत्तर
देखि 27.43° उत्तरी
अक्षांश र 83.31°
पूर्वदेखि 83.34° पूर्वी
देशान्तरमा रहेको छ ।

Altitude

Highest : 1680
meters

Lowest : 402
meters

Tansen (Town) : 1350
meters

Population size and distribution

Population Highlights

TOTAL POPULATION

50,792



SEX RATIO

85.52 Male per 100 Female


POPULATION DENSITY

463

TOTAL HOUSEHOLDS

14,782

Ward wise population distribution

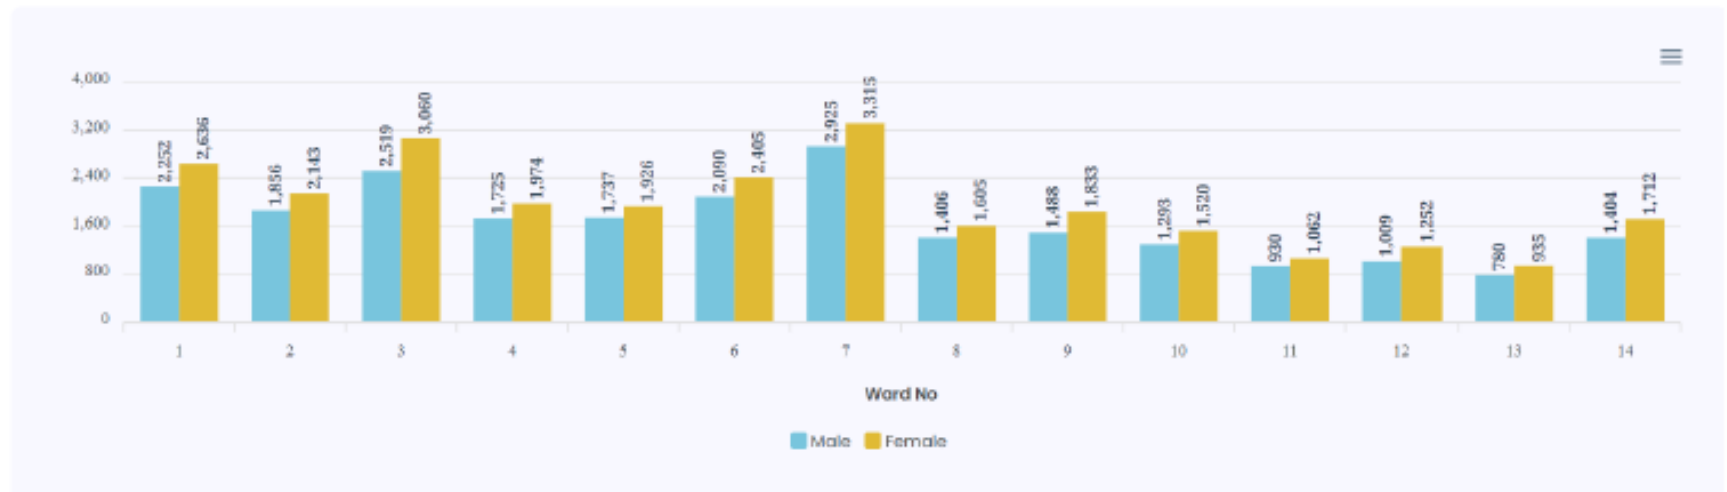


श्रोत: राष्ट्रीय जनगणना, २०७८

पालिकाको दीर्घकालीन सोच

“समृद्ध सांस्कृतिक नगर”

गत आ.व.२०८०/०८१ को वित्तीय लक्ष्य तथा प्रगति

शिरषक	आम्दानी	खर्च	प्रगति प्रतिशत
चालु	६०,५१,०८,२५४	५४,६४,३५,३१९।९६	९०.३
पूँजीगत	४४,६३,०१,७६६	३१,८२,५७,५२८।८५	७१.३१
कूल	१,०५,१४,१०,०२०	८६,४६,९२,८४८।८१	८२.२४

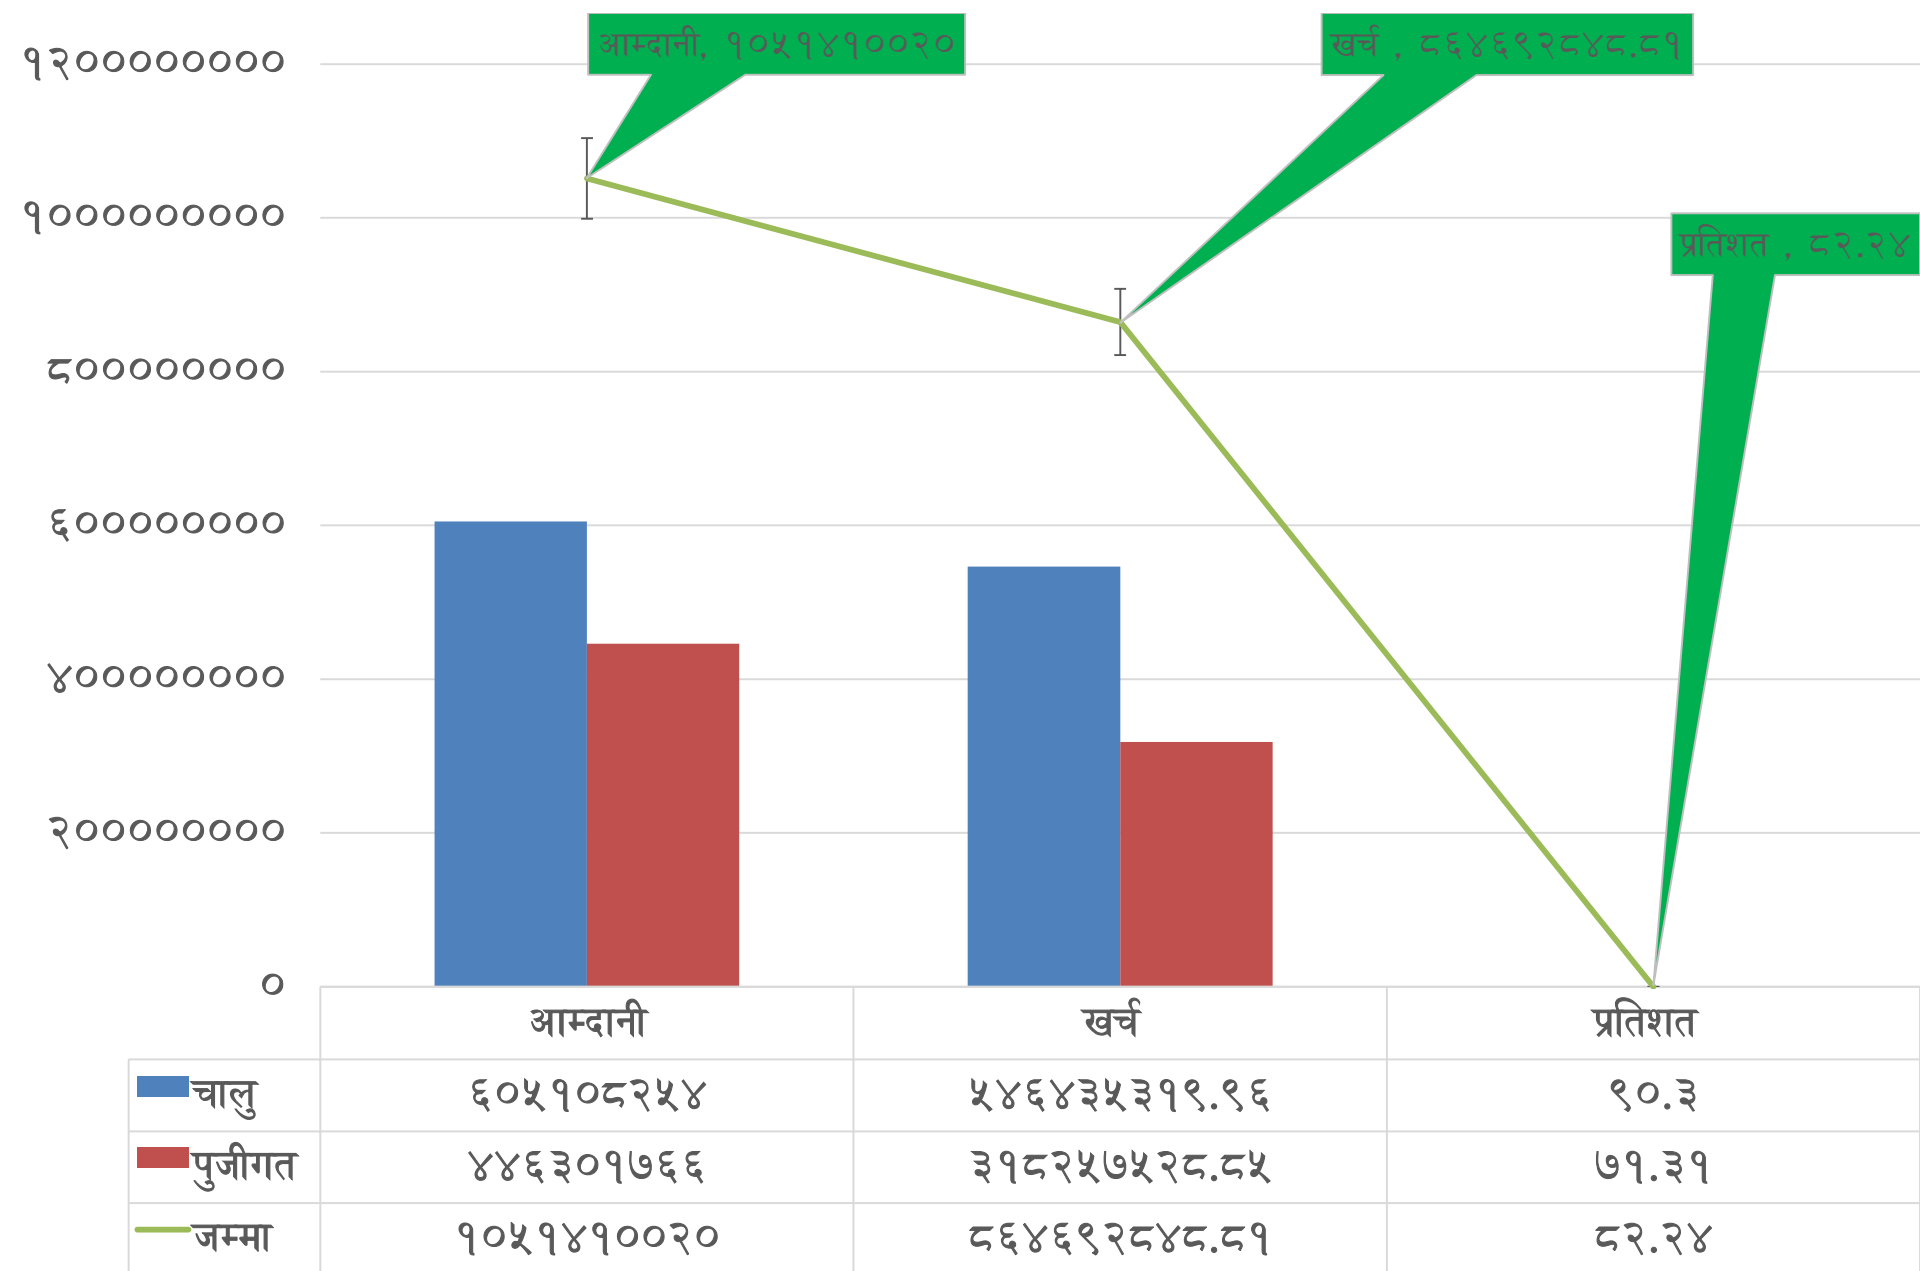


आय र व्ययको विस्तृत विवरण

क्र.सं.	स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	कुल आम्दानी
१	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान - नगद अनुदान	१५,२८,००,०००.००	१४,२१,०४,०००.००
२	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान चालु - नगद अनुदान	४०,८८,७१,०००.००	४०,५०,६०,७५०.००
३	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	७,४९,६२,०००.००	७,४९,६२,०००.००
४	नेपाल सरकार - विशेष अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	२,२०,००,०००.००	९६,१३,५७९.००
५	नेपाल सरकार - समपुरक अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	१,१०,००,०००.००	४५,३२,२१५.००
६	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान - नगद अनुदान	१,१५,४५,०००.००	८६,५८,७५०.००
७	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान चालु - नगद अनुदान	४४,५०,०००.००	३९,९०,०००.००
८	लुम्बिनी प्रदेश - शसर्त अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	१,३२,००,०००.००	१,१७,६०,०००.००
९	लुम्बिनी प्रदेश - विशेष अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	१५,००,०००.००	१३,१७,४०८.००
१०	लुम्बिनी प्रदेश - समपुरक अनुदान पुँजीगत - नगद अनुदान	१,५०,००,०००.००	१,४४,००,०००.००
११	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार - राजस्व बाँडफाँड - नगद	९३,०२,२४१.००	१,३०,६९,४०३.७८
१२	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय - राजस्व बाँडफाँड - नगद	१,००,००,०००.००	१,४३,८३,५५८.७२
१३	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - राजस्व बाँडफाँड - नगद	११,५६,२५,०००.००	१०,६९,७८,६२३.३०
१४	सडक बोर्ड - आन्तरिक श्रोत - नगद	७५,००,०००.००	६३,९९,६८५.००
१५	आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद	६,००,००,०००.००	८,००,५१,८३०.५९
१६	आन्तरिक श्रोत - राजस्व बाँडफाँड - नगद	२,००,००,०००.००	०.००
१७	आन्तरिक श्रोत - बैंक मौज्दात - नगद	६,४०,०४,७७९.८६	५,९७,९९,११५.८२
१८	नगर विकास कोष - आन्तरिक श्रोत - नगद	२,०६,५०,०००.००	२,०६,०२,३९२.००
१९	नगर विकास कोष - नगद - नगद	०.००	०.००
२०	भारत - बैदेशिक अनुदान - नगद अनुदान (बैदेशिक)	२,४०,००,०००.००	०.००
२१	जन सहभागिता - आन्तरिक श्रोत - नगद	५०,००,०००.००	०.००
जम्मा		१,०५,१४,१०,०२०.८६	९७,७६,८३,३११.२१

क्र.सं.	नाम	बजेट			खर्च		
		चालु	पूजीगत	जम्मा	चालु	पूजीगत	जम्मा
१	प्रवदनात्मक कार्यक्रम	३,६१,५०,०००.००	१,५३,००,०००.००	५,१४,५०,०००.००	२,४८,४६,४७४.९०	१,३४,७०,७८४.६८	३,८३,१७,२५९.५८
२	प्रशासनिक खर्च	१२,४३,३९,६५३.००	१६,०१,०००.००	१२,५९,४०,६५३.००	११,९४,४६,५१५.४६	१२,४९,९३४.००	१२,०६,९६,४४९.४६
३	बित्तिय ब्यवस्था	४७,२२,०००.००	०.००	४७,२२,०००.००	४७,२१,९२०.३९	०.००	४७,२१,९२०.३९
४	समपुरक कोष मार्फत संचालन कार्यक्रम तथा अन्य योजना / कार्यक्रमहरु	२५,००,०००.००	२,३३,१४,३६७.००	२,५८,१४,३६७.००	१५,७१,२८४.००	१,१५,६१,०८८.००	१,३१,३२,३७२.००
५	विशेष कोष मार्फत हुने कार्यक्रम	४०,००,०००.००	५०,००,०००.००	९०,००,०००.००	१२,९६,६०३.५०	३६,१२,२८८.००	४९,०८,८९१.५०
६	गत आ.व को भूक्तानी दिनुपर्ने योजना	०.००	६,११,७३,१५२.००	६,११,७३,१५२.००	०.००	४,२८,५६,९२०.००	४,२८,५६,९२०.००
७	अतिरिक्त योजना तथा कार्यक्रम	८५,००,०००.००	३,२५,५०,०००.००	४,१०,५०,०००.००	४३,२४,०३१.००	२,४२,०५,०३१.००	२,८५,२९,०६२.००
८	नगर स्तरीय आयोजना	१४,९३,०००.००	६,२९,३३,८४८.००	६,४४,२६,८४८.००	३,५१,४४२.००	२,२१,१४,७२३.००	२,२४,६६,१६५.००
९	नगर विकास कोष रिण	०.००	२,०६,५०,०००.००	२,०६,५०,०००.००	०.००	२,०६,०२,३९२.००	२,०६,०२,३९२.००
१०	तानसेन नगरपालिकावडा नं.१	१,८०,०००.००	४८,१६,६४८.००	४९,९६,६४८.००	१,७१,६९०.००	४६,५१,४००.००	४८,२३,०९०.००
११	तानसेन नगरपालिकावडा नं.२	११,४४,०४०.००	३०,९०,०००.००	४२,३४,०४०.००	११,३३,६५४.००	२७,७९,१५४.००	३९,१२,८०८.००
१२	तानसेन नगरपालिकावडा नं.३	६,९४,९४६.००	४०,३६,०००.००	४७,३०,९४६.००	६,२९,०६८.००	३९,५०,२६६.००	४५,७९,३३४.००
१३	तानसेन नगरपालिकावडा नं.४	१५,३८,५७९.००	२७,८०,०००.००	४३,१८,५७९.००	१३,९१,१७१.००	२६,१५,७१३.००	४०,०६,८८४.००
१४	तानसेन नगरपालिकावडा नं.५	५,८४,९३७.००	४६,५०,०००.००	५२,३४,९३७.००	५,१८,९२२.००	४४,७८,३३२.१८	४९,९७,२५४.१८
१५	तानसेन नगरपालिकावडा नं.६	३,५०,०००.००	४७,२७,३७३.००	५०,७७,३७३.००	३,३५,०००.००	४५,७५,९५२.००	४९,१०,९५२.००
१६	तानसेन नगरपालिकावडा नं.७	८,९९,०००.००	४४,३५,१९०.००	५३,३४,१९०.००	८,२७,९७२.००	४२,४९,३३७.००	५०,७७,३०९.००
१७	तानसेन नगरपालिकावडा नं.८	१४,६३,२७३.००	३७,०३,२२४.००	५१,६६,४९७.००	१३,८५,५१०.००	३५,३८,७४१.००	४९,२४,२५१.००
१८	तानसेन नगरपालिकावडा नं.९	११,२५,०००.००	३६,६२,३७२.००	४७,८७,३७२.००	१०,८६,९५२.००	३४,५६,४६९.००	४५,४३,४२१.००
१९	तानसेन नगरपालिकावडा नं.१०	३,२५,०००.००	५१,६३,३८२.००	५४,८८,३८२.००	३,२१,५२५.००	५०,०२,५५७.००	५३,२४,०८२.००
२०	तानसेन नगरपालिकावडा नं.११	३,००,०००.००	४६,००,१३१.००	४९,००,१३१.००	२,९९,०००.००	३३,१०,०६४.००	३६,०९,०६४.००
२१	तानसेन नगरपालिकावडा नं.१२	२,००,०००.००	४९,०७,३२४.००	५१,०७,३२४.००	१,९९,९६०.००	४६,५९,९६९.००	४८,५९,९२९.००
२२	तानसेन नगरपालिकावडा नं.१३	४,८०,०००.००	४६,७०,७५५.००	५१,५०,७५५.००	४,५०,६७१.००	४२,२१,००५.००	४६,७१,६७६.००
२३	तानसेन नगरपालिकावडा नं.१४	७,९७,८२६.००	४३,७५,०००.००	५१,७२,८२६.००	७,९४,८२६.००	४१,१५,९४८.००	४९,१०,७७४.००
२४	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	४०,८८,७१,०००.००	७,४९,६२,०००.००	४८,३८,३३,०००.००	३७,६७,७१,१२७.७१	६,९४,५९,०१२.००	४४,६२,३०,१३९.७१
२५	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	०.००	२,२०,००,०००.००	२,२०,००,०००.००	०.००	९६,१३,५७९.००	९६,१३,५७९.००
२६	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)	०.००	२,२०,००,०००.००	२,२०,००,०००.००	०.००	९२,४७,०७९.०७	९२,४७,०७९.०७
२७	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	४४,५०,०००.००	१,३२,००,०००.००	१,७६,५०,०००.००	३५,६०,०००.००	१,१७,५२,४५२.००	१,५३,१२,४५२.००
२८	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)	०.००	१५,००,०००.००	१५,००,०००.००	०.००	१३,१७,४०८.००	१३,१७,४०८.००
२९	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान)	०.००	३,०५,००,०००.००	३,०५,००,०००.००	०.००	२,१५,८९,९३०.९२	२,१५,८९,९३०.९२
	जम्मा	६०,५१,०८,२५४.००	४४,६३,०१,७६६.००	१,०५,१४,१०,०२०.००	५४,६४,३५,३१९.९६	३१,८२,५७,५२८.८५	८६,४६,९२,८४८.८१

राजस्व प्राप्तिको अवस्था

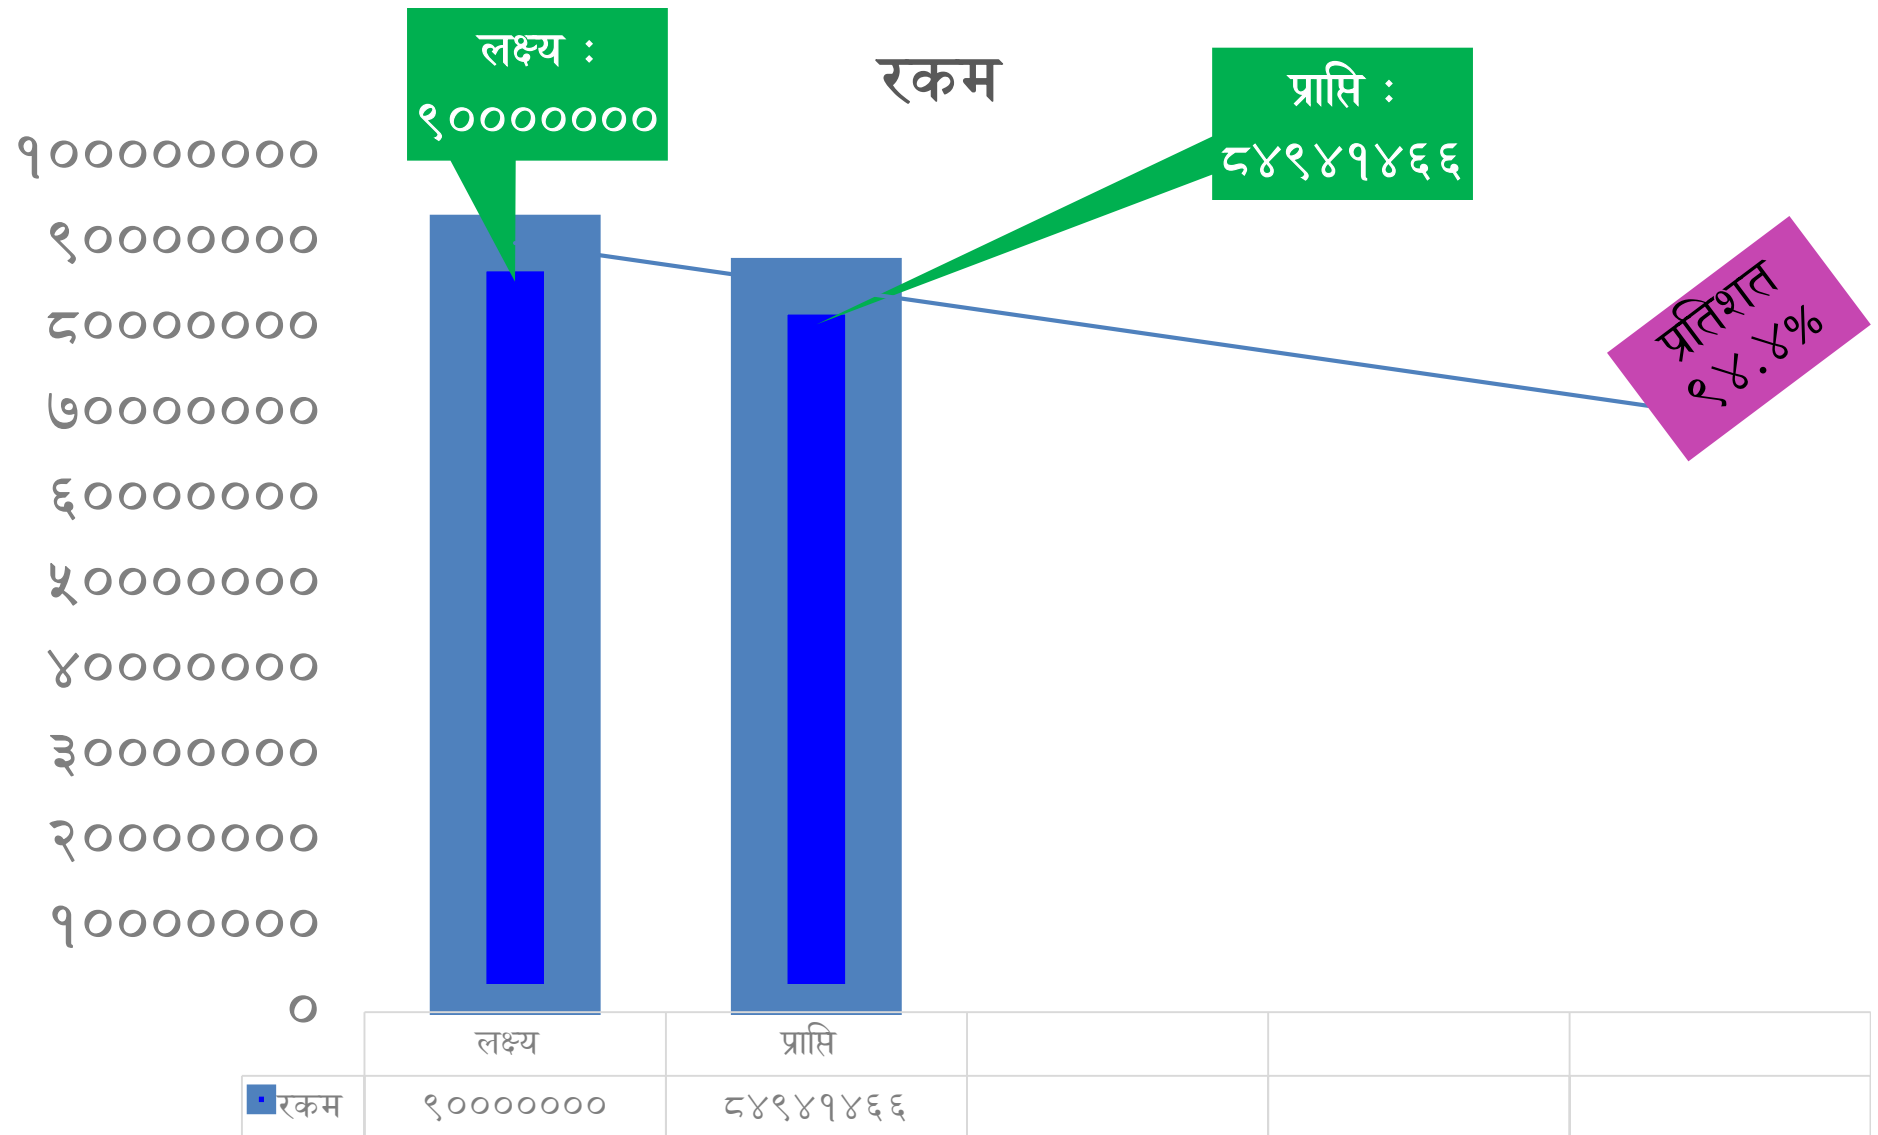

राजश्व संकलनको लक्ष्य र प्रगतिको विस्तृत विवरण

आ.व. २०८०/०८१ को आन्तरिक आय प्रगती विवरण

संकेत नं.	शिर्षक	अनुमान	यथार्थ
११३१३	सम्पत्ती कर	७५०००००	६३३३३९५।९७
११३१४	भुमिकर/मालपोत	४००००००	४२३८३६३।८३
११३१७	बहाल कर (घर, जग्गा, अन्य)	१०००००००	९८४४८२५।४४
११३१८	बहाल विटौरी कर	१५०००००	३२१४१८
११४५१	साना सवारी साधन कर	१५०००	३६५००
११४५२	स्थानीय पुर्वाधार सेवाको उपभोगमा लाग्ने शुल्क/कर	१०००००००	८८५८९६०
११६३१	कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोबार	०	
११६३२	अखेटोपहारमा लाग्ने कर	०	
११६९१	अन्य कर		२३३७७८९।७७
१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट हुने आय	२००००००	२२२०४६०
१४६११	व्यवसाय कर	३५०००००	३८९३२६६।६
१४१५९	अन्य श्रोतबाट प्राप्त (रोयल्टी)	२०००००००	६८५९११।८२
१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम		१०७७५
१३४११	अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान	०	
१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	७७०००००	४६२२४१०।८२
१४२२१	न्यायिक दस्तुर		४४००
१४२२४	परीक्षा शुल्क		२६१५२०
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क		
१४२४१	पार्किङ शुल्क	७०००००	१४३१००५

क्रमशः

१४२४२	नक्सापास दस्तुर	४००००००	९०८१६००
१४२४३	सिफारिश दस्तुर		
१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर		१३१०९३५
१४२४५	नाता प्रमाणित		३३१९८०
१४२४९	अन्य दस्तुर	१५५००००	१९४९८६९।३
१४२५३	व्यवसाय राजिष्ट्रेशन दस्तुर	२५०००	८५७४५
१४३११	न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत		
१४३११	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत		२६०७७१।८
१४५२१	प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क		५८०९३८
१४५२९	अन्य राजश्व	१००००	३२२१०
	जडिबुटी कवाडी	५०००००	३५२०००
	सामूदायिक वनबाट विक्री		
	बस्तु तथा सेवा विक्रीबाट प्राप्त रकम	१५०००००	४९०२०५९।२
	महोत्सवबाट	५००००००	६२२७०००
३३३४२	अन्य मनोरञ्जन कर (वि.कोष)	१०००००	१३३८९१
३३३४३	विज्ञापन कर (वि.कोष)	४०००००	७१३८५०
३३३६६	दहत्तर बहत्तर शुल्क (वि.कोष)		१९५६२६०।३२
जम्मा		८०००००००	७३०२०१११।८७
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन (मालपोत कार्यालय)		१०००००००	११९२१३५५
कूल जम्मा		९०००००००	८४९४१४६६।८७

गत आ.व.को योजनाको लक्ष्य तथा प्रगति

भौतिक पुर्वाधार र कार्यक्रमसहितको योजनाको प्रगती प्रतिवेदन													
विवरण	वडा स्तरिय	मागमा आधारित	मर्मत संभार	समपूरक	प्रदेश शसर्त/	प्रर्वद्धतात्मक / समपूरक कार्यक्रम	अनूसूची ७ अतिरिक्त योजना तथा कार्यक्रम	माघ २६ को का.पा. नि.बाट थप भएको योजना	५०-५० योजना	म.मैत्री पुर्वाधार	संघ समपूरक/ विशेष	जम्मा योजना संख्या	कैफियत
कूल स्वीकृत योजना संख्या	३७२	१४	१२	५	१८	५	४५	८६	१४	५	१५	५९१	
सम्भौता नभएको	४	०	०	०	०	०	०	२	६	०	०	१२	
सम्भौता भएको योजना	३६८	१४	१२	५	१८	५	४५	८४	८	५	१५	५७९	६
सम्पन्न भएको योजना संख्या	३६६	१४	१२	५	१८	५	४५	८२	८	३	१५	५७७	
सम्भौता प्रतिशत				९७.९६									
भूक्तानी प्रतिशत				९६.९५									

भौतिक पुर्वाधार तर्फको मात्र योजनाको प्रगती प्रतिवेदन

विवरण	वडा स्तरिय	मागमा आधारित	मर्मत संभार	प्रदेश / समपूरक	प्रदेश / शसर्त /	प्रर्वद्धनात्मक / समपूरक कार्यक्रम	अनूसूची ७ अतिरिक्त योजना तथा कार्यक्रम	माघ २६ को का.पा. नि.बाट थप भएको योजना	५०-५० योजना	म.मैत्री पुर्वाधार	संघ समपूरक/बि शेष	जम्मा योजना संख्या	कैफियत
कूल स्विकृत योजना संख्या	२९६	१४	१२	५	१५	४	४०	८६	१४	५	१०	५०१	
सम्भौता नभएको	४	०	०	०	०	०	०	२	६	०	०	१२	
सम्भौता भएको योजना संख्या	२९२	१४	१२	५	१५	४	४०	८४	८	५	१०	४८९	६
सम्पन्न भएको योजना संख्या	२९०	१४	१२	५	१५	४	४०	८२	८	३	१०	४८३	
९७.६०		सम्भौता प्रतिशत											
९८.७७		भूक्तानी प्रतिशत											

वडागत भौतिक पुर्वाधार र कार्यक्रसहितको योजनाको प्रगती प्रतिवेदन

वडा नं.	स्विकृत वडास्तरिय स्तरिय	सम्झौता भएको वडागत.यो	वडा स्तरिय सम्पन्न	मागमा आधारित	मर्मत संभार	५०-५० योजना	प्रदेश समपूरक	प्रदेश शसर्त	प्रर्वद्धनात्मक / समपूरक कार्यक्रम	माघर्देको का.पा. नि.बाट थप	अनूसूची ७	संघ विशेष	म.मैत्री पुर्वाधार	संघ समपूरक	जम्मा योजना संख्या	हाल सम्म सम्झौता भएको	हालसम्म सम्पन्न भएको
१	२३	२३	२३	१	१	१			१	७	३	४		१	४२	४२	४२
२	२५	२५	२५	१	१		१	२	२	५	१		१		३९	३८	३८
३	१८	१८	१८	२	१					२	१				२४	२२	२२
४	२३	२१	२१			१	१			५	३				३३	३१	३१
५	२४	२२	२२	२			१	२		७	४	१	१		४२	४१	४१
६	१९	१९	१९			२			१	९	४	१			३६	३५	३५
७	२६	२६	२६	१	१	५	१	२		११	४	२	२		५५	५३	५१
८	३१	३१	३१	२	१	२	१	१		५	२				४५	४४	४४
९	३५	३५	३५	१	१	२		३		७	४	२			५५	५५	५५
१०	२७	२७	२७	१	२					६	१				३७	३७	३७
११	३१	३१	३१	१				१	१	३	३				४०	४०	४०
१२	३४	३४	३३	१						७	२			१	४५	४५	४४
१३	२५	२५	२४					३	३	६	२				३९	३८	३७
१४	३१	३१	३१	१	४	१	०	१	१	५	६			०	५०	४९	४७
जम्मा	३७२	३६८	३६६	१४	१२	१४	५	१५	९	८५	४०	१०	४	२	५८२	५७०	५६४

नोट: ९ वटा योजनाहरु कृषि सामग्रीहरु बितरणको रिपोर्ट नभएकोले फरक परेको छ ।

प्रमुख पूर्वाधार योजनाको लक्ष्य तथा प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		सम्भौता रकम	बार्षिक वित्तीय प्रगति (यस अवधि सम्मको खर्च)	
			परिमाण	बजेट		रकम	प्रतिशत
१	प्रदेश समपुरक	वटा	५	३०००००००	२२३११९७३	२०३७९६३०।८४	९१।३
२	संघ समपुरक	वटा	२	२२००००००	१४४८७००७	८७३५१४०।६४	६०।३
३	संघ बिशेष अनुदान	वटा	२	२२००००००	१४६०५९२९	९४०३३६९।३९	६५।८
४	प्रदेश बिशेष अनुदान	वटा	१	१५००००००	१३१७४०८	१३१७४०८	१००
५	प्रदेश सशर्त आयोजना	वटा	१	२५००००००	२४३९८७९	२२७०२९१।३५	९३।०४
६	नगरपालिकाका अन्य योजना	वटा	१८	१७४५१८९१	१६५५१२२७	१४२३४५९३	८६
७	औद्योगिक ग्राम निर्माण योजना (निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको)	वटा	१	९०००००००	६००८९२४	१२८३३६८।५१	२१।४
८	शीत भण्डार निर्माण आयोजना (निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको)	वटा	१	५००००००००	४८२२०५४८	१८६१८९७१।१	३८।६
९	सडक बोर्ड	वटा	३	१४०००००००	१४३१८१८२	३१५०००००	२२।५
१०	शहरी शासकीय पूर्वाधार कार्यक्रम	वटा	१	१०००००००००	५८००००००००	६५९००००००	११.३६
	बनदेवी बसपार्क निर्माण योजना	वटा	१	२४३०३५५५०	१८१३१८११३	३९००५०७	२.१५
	बगाले खेल मैदान निर्माण योजना	वटा	१	१९४५११३७१३	१९४५११३७१३	१९२८३२४४।१९	९९।१

मुख्य आयोजनाको विस्तृत विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		समझौताकम	वार्षिक प्रगति भौतिक		यस अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	बजेट		परिमाण	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
	प्रदेश समपुरक अनुदान आयोजना								
१	राधे राधे जाने बाटोको ढल व्यवस्थान, जिप पार्क तथा शौचालय ता.न.पा. २	वटा	१	६००००००	४८८४८८२।४	१	९८।२	४७९७९२३।४	९८।२
२	होलाङ्गदी धारा संरक्षण साथै ढल व्यवस्थापन तानसेन ४	वटा	१	६००००००	४९९८८४६।८	१	९६।१	४८०२७९९।८	९६।१
३	भालेबास छाप कोकल पिपलडाडा सडक स्तारोन्नती, ता.न.पा. ८	वटा	१	६००००००	४३५५०८२।९	१	९३।२	४०५८५९२।९	९३।२
४	प्रभास रक्साह, काजिपौवा हूदै तानसेन जोड्ने सडक, ता.न.पा. ७	वटा	१	६००००००	४१३३९९०।३	१	९७।५	४०३२५८२।९	९७।५
५	सल्लेरी डाडादेखि रावलटोल हूदै धूनाघाट जाने बाटो ता.न.पा. ५	वटा	१	६००००००	३९३९१७१	१	६८	२६७९७३३।४	६८
	जम्मा			३०००००००	२२३११९७३	१	९०।६	२०३७१६३१	९०।६

प्रदेश विषेश अनुदान आयोजना

१	चियानडांडा देखि कैलाशनगर हुदै बसन्तपुर पाईपलाइन विस्तार	वटा	१	१५०००००	१३१७४०८।२	१	१००	१३१७४०८।२	१००
	जम्मा			१५०००००	१३१७४०८		१००	१३१७४०८	१००
प्रदेश सशर्त अनुदान आयोजना									
१	सहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण, ता.न.पा. २, पाल्पा	वटा	१	२५०००००	२४३९८७८।८	१	९३	२२७०२९१।४	९३
	जम्मा			२५०००००	२४३९८७९		९३	२२७०२९१	९३

	संघीय समपुरक अनुदान आयोजना								
१	बतासेडांडा चण्डीभन्ज्याङ्ग, भूल्के, जोर्ते सडक निर्माण आयोजना	वटा	१	१०००००००	६२९९६५४११	१	९८।४	६१९७४१८।४	९८।४
२	पोलधारा आपटारी आमपार्क सडक स्तरउन्नती कार्य	वटा	१	१२००००००	८१८७३५२।५	१	३१	२५३७७२२।२	३१
	जम्मा			२२००००००	१४४८७००७	१	६४।७	८७३५१४१	६४।७
	संघीय विषेश अनुदान आयोजना								
१	दमकडा माध्यमिक विद्यालय आवाशीय शिक्षण परियोजना	वटा	१	१०००००००	६९९८४०७।९	१	१००	६९९६४०९।९	१००
२	तल्लो खल्लुकबोट खानेपानी आयोजना ता.न.पा.५	वटा	१	१२००००००	७६०७५२१।५	१	३१।६	२४०६९५९।५	३१।६
	जम्मा			२२००००००	१४६०५९२९		६५।८	९४०३३६९	६५।८
	संघीय सशर्त अनुदान आयोजना								
१	धोबिधारा देखि न्योपाने बस्ती देविनगर पथ सम्मको सडक ढलान	वटा	१	२५०००००	२०६११९२।९८	१	९५।६	१९६९८७०	९५।६

नगरपालिका कार्ययोजना

	नगरपालिका कार्ययोजना								
१	बिर्ता शान्ति टोल, कालापानी लिफ्ट खानेपानी	वटा	१	५५००००	५२३७८८८४	१	९८५	५१६०२९१९८	९८५
२	ता.न.पा. ३ नं.वडामा ट्रस निर्माण कार्य	वटा	१	७०००००	६५४७८०१७६	१	१००	६५४७८०१७६	१००
३	गणेशमान स्मृति सभाहल मर्मत तथा व्यवस्थापन	वटा	१	८०००००	७५२१७२११	१	९०२	६७८५६८८४	९०२
४	त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पुर्वाधार संरक्षण	वटा	१	१००००००	९४३५१०१२	१	९१३	८६१८०४१९	९१३
५	तालीको पधेरो मर्मत तथा निर्माण	वटा	१	२०००००	१९३९५९१५३	१	९९८	१९३६३६८	९९८
६	कैलाशनगर खा.पा. पाइप खरिद (सांस्कृतिक डबलीदेखि चतुर्भुजको घर जाने बाटो)	वटा	१	२०००००	१९३४६७३	१	९८३	१९०२५३५८	९८३
७	सडकमा पर्यटन आकर्षणका लागि मखनटोल सडक पूर्वाधार निर्माण तथा शौन्दर्यकरण	वटा	१	१००००००	९५८०८८९२	१	९४१	९०११९१८	९४१
८	१२ नं. वडा कार्यालयको भवन निर्माण	वटा	१	४००००००	३२९९२९६३	१	९६	३१६८६१३५	९६
९	१३ नं. वडा कार्यालयको भवन निर्माण (थप कार्य)	वटा	१		६६७३६०१९२	१	९५५	६३७५२९१४२	९५५
१०	सार्वजनिक शौचालय निर्माण	वटा	१	५०००००	४९३१५३८७	१	९९३	४८९५१९१५	९९३
११	लहरेपिपल स्वस्थ चौकीको बाउन्डरी निर्माण	वटा	१	६०००००	५७००१०१७	१	९३७	५३४११४१०१	९३७
१२	पौडे खोल्सा ढलान कार्य	वटा	१	५०००००	४७६२७५१८	१	९९६	४७४६००१३६	९९६

१३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय क्यान्टिन निर्माण	वटा	१	१२५०००	१२४४०११९	१	९२।३	११४७६३।३४	९२।३
१४	लहरेपिपल ढल निर्माण	वटा	१	६७६८९१।१७	६४५१८१।८६	१	१००	६४५१८१।८६	१००
१५	वडा नं. १ को वडा कार्यालयको अधुरो भवन निर्माण	वटा	१	२५०००००	१८९५०६८।१	१	९७।५	१८४६८६९।७	९७।५
१६	सार्वजनिक शौचालय निर्माण, श्रीनगर डांडा र जिल्ला अदालत	वटा	१	२५०००००	२६३६७०१।५	१	३१	८१६०८७।४५	३१
१७	वडा नं. ७ को वडाकार्यालयमा ट्रेस निर्माण	वटा	१	१००००००	९५४९०९।१७	१	९८।६	९४१९३८।४८	९८।६
१८	होलांग्दी ढल निर्माण तथा बस पार्किंग	वटा	१	६०००००	५६९१७।३४	१	१००	५६९१०९।३२	१००
	जम्मा			१७४५१८९१।१७	१६५५१२२७		९३।१	१४२३४५९३	९३।१
अन्य आयोजना									
१	औद्योगिक ग्राम आयोजना	वटा	१	९००००००	६००८९२४	१	२१।४	१२८३३६८।५	२१।४
२	शीत भण्डार निर्माण कार्य	वटा	१	४९९९१९०६	४९९९१९०६	१	४५	१८६१८९।७१	३८
३	बगाले खेल मैदान निर्माण	वटा	१	१९४५११३७।१३	१९४५११३७	१	९९।१	१९२८३२४।४	९९।१
४	बसपार्क निर्माण	वटा	१	२५०००००००	१८१३१८११३	१	१४	२४८१५३५।७	१३।७
५	डुम्रे सुनडाडा तेलघा गुफाचौर सडक निर्माण	वटा	१	५८४०१४३४५	४५७६८३०८४	१	५	५८९४८०००	१२।९


आ.व.२०८०/०८१ को भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	कार्यक्रम		ईकाइ	जम्मा
१	सडक	नयाँ सडक निर्माण कार्य	कि.मि.	६.२८
		सडक स्तरोन्नती तथा मर्मत कार्य	कि.मि.	२१.९४
		सडक कालोपत्रे तथा ढलान कार्य	कि.मि.	६.६२
		कल्भर्ट निर्माण	संख्या	११
२	भवन	सामुदायिक भवन/ट्रस भवन निर्माण तथा मर्मत	संख्या	५३
		मन्दिर	संख्या	७
		प्रतिक्षालय	संख्या	९
		शौचालय निर्माण तथा मर्मत कार्य	संख्या	१४
३	खानेपानी	पाइप खरिद	कि.मि.	१२.७३
		धारा तथा टंकी निर्माण तथा मर्मत कार्य	संख्या	२७
४	ढल निर्माण तथा मर्मत		मि.	४२८.५६
५	खेल मैदान निर्माण तथा स्तरोन्नती		वटा	६
६	सिंचाई कुलो निर्माण तथा मर्मत		कि.मि.	१.३७

उपलब्धिमूलक कार्यहरु

स्थानीय तह स्वःमूल्यांकन (LISA) तथा वित्तीय जोखिम मूल्यांकन (FRA) मा जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल गरिएको साथै आ.व. २०८०/२०८१ को स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको जिल्ला स्तरीय अन्तरपालिका मूल्याङ्कनमा समेत तानसेन नगरपालिका प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA)

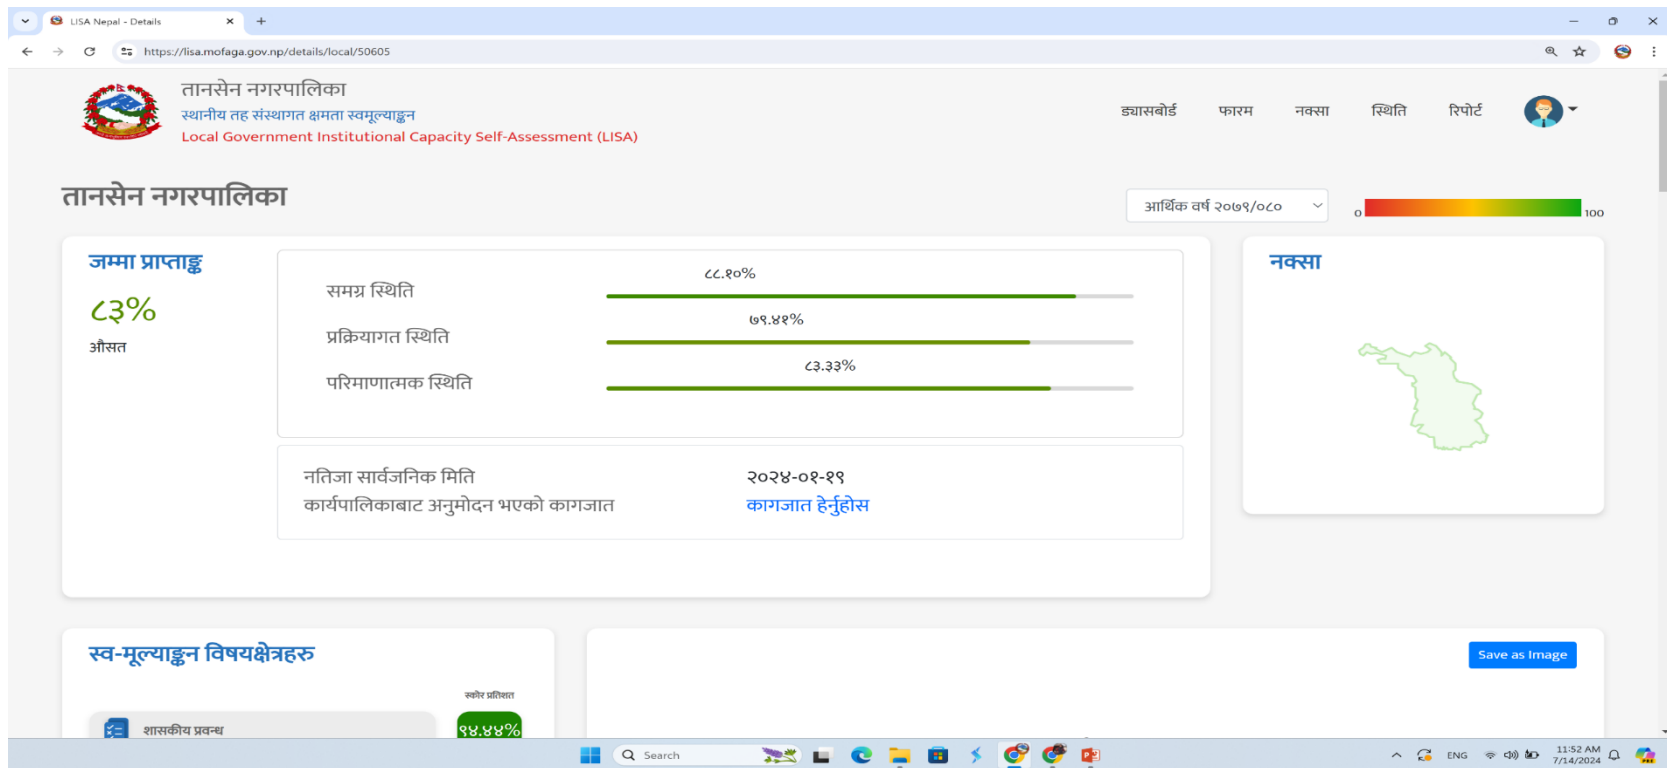

हाल गुणस्तर परीक्षणमा ८१ अंक प्राप्त भएको

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA)

FIDUCIARY RISK ASSESSMENT

क्र.स.	प्रक्रियाको जोखिम	नतिजाको जोखिम	वित्तीय अनुशासनको जोखिम	नतिजा
१	गापा/नपाबाट अनुशिक्षण सम्पन्न	२०८१-१-१९	२०८०-८-२८	सम्पन्न
२	गापा/नपाबाट प्रारम्भिक नतिजा तयार	२०८१-२-२	२०८०-१०-९	८५.५
३	जि.स.स.बाट मूल्याङ्कन गर्न तय मिति	२०८१-२-१९	२०८०-१०-१०	सम्पन्न
४	जि.स.स.बाट प्रारम्भिक नतिजा तयार	२०८१-३-२	२०८०-१०-१२	७२
५	जि.स.स.बाट तयार प्रारम्भिक नतिजामा गापा/नपाको पृष्ठपोषण	२०८१-३-१८	२०८०-१०-१५	सम्पन्न
६	जि.स.स.बाट अन्तिम नतिजा तयार	२०८१-३-३२	२०८०-१०-१६	७७

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा पाल्पा जिल्लाका स्थानीयतहहरूमा तानसेन नगरपालिकाले ७७ अंक प्राप्त गरि जिल्लामा प्रथम भएको ।



लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

स्वास्थ्य कार्यालय, पाल्पा

प्रमाण-पत्र

आ.व. २०८०/०८१ मा पाल्पा जिल्लाका स्थानीय तह र अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाबाट संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको मुख्य-मुख्य सूचकहरूको आधारमा, मूल्यांकन गर्दा तानसेन नगरपालिका प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएकोले स-धन्यवाद यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ ।

डा राजेन्द्र कुमार गिरी
कार्यालय प्रमुख

टंकनाथ खनाल
प्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति, पाल्पा
मिति : २०८१/०५/१०


माननीय खेम बहादुर सारु
स्वास्थ्य मन्त्री
लुम्बिनी प्रदेश

थप संख्यात्मक तथा गुणात्मक
विषयगत उपलब्धिहरु :

पूर्वाधार विकास



बगाले खेल मैदान निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको

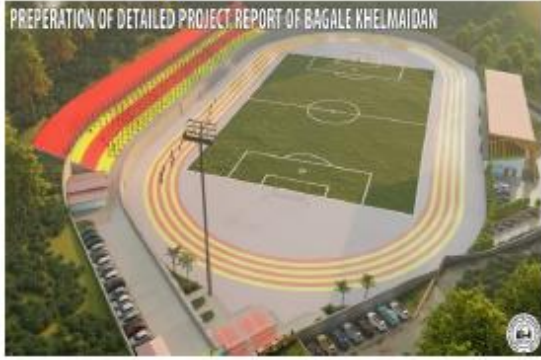

बगाले खेल
मैदान, क्रमागत..



पाल्पा दरबार क्षेत्र सौन्दर्यकरण तथा व्यवस्थापन गरिएको (नगर, संघ, प्रदेश)





तानसेन नगरपालिका वडा नं. ५ बनदेवी क्षेत्रमा बसपार्क निर्माण कार्य कार्यान्वयनमा रहेको



(आर.इ.वाल प्रविधि)





नेपाल सरकार (विश्व बैंक) को सहयोगमा डुम्रै तेलघा गुफाचौर होलाङ्गदी पक्की सडक निर्माण कार्य कार्यान्वयनमा रहेको





तानसेन नगरपालिका, पाल्पा - Tansen municipality Official

2 May · 🌐

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा संचालित
डुम्रेखोला ,सुन डाडा तेलघा गुफा चौर ,गाउँन डा...

See more



75

11 comments 19 shares



Like



Comment



Send



Share




रानीमहल प्रवेशको बैकुण्डे पहरा क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यमा समन्वय तथा सहयोग



क्रमशः :

- विभिन्न वडाहरुमा ढल तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको
- वडा नं.१,३,५,७,१०,११,१२ को कार्यालय भवन निर्माण तथा स्तरोन्नती गरिएको
- लक्ष्मी मा.वि. डाइलोसिस अस्पताल जाने सडक निर्माण सम्पन्न
- महिलामैत्री साना पूर्वाधारको थालनी गरिएको (तानपा ७ धोविधारा, ता.न.पा. २ तीनधारा क्षेत्र, ता.न.पा. ५ सामुदायिक भवन)

सम्पदास्थलको संरक्षण योजना तयार गरिदै



- जहाँ मार्किङ्ग त्यहा पार्किङ्ग अवधारणा सहित ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सडक मार्किङ्ग गरिएको साथै उपयुक्त स्थानमा सीसी क्याम जडान गरी सुरक्षा व्यवस्थामा सहयोग पुऱ्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरिएको
- तानसेनको पुरानो बसपार्कमा मल्टिलियर कार पार्किङ्ग र ता.न.पा. ५ स्थित बतासे डाँडामा आठ सय क्षमताको सिटी हल निर्माणको डिपीआर तयारी भएको र माण्डव्य सरोवर र प्रभास ताल क्षेत्रको डिपीआर निर्माणको लागि पनि नगर विकास कोषमा अनुरोध गरिएको ।


आर्थिक विकास

- प्रदेश सरकारबाट श्रीनगर सांस्कृतिक डबली हस्तान्तरणमा लिई संचालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको
- ऐतिहासिक तथा परम्परागत जात्रा पर्व, सडक महोत्सवमा, रोटी महोत्स, यमोरी पुन्ही लगायत संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धन
- औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको
- थोक कृषि बजार केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरिएको

पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि नगरका सीमा क्षेत्रहरुमा विद्युतीय होर्डिङ्ग बोर्ड राखिएको



लोपुन्मुख अदुवा वालीको प्रवर्द्धन तथा प्रशोधन (अदुवा भण्डारण गृह संचालनमा किसानलाई प्रति किलो रकम रु.५ अनुदान प्रदान गरिएको)



प्लम्बिङ्ग तालिम पश्चात कार्यस्थलमा अनुगमन



सामाजिक विकास

- 'ग' वर्गको अपाङ्गता भएका ८० जनालाई मासिक रु. ५०० सहयोग प्रदान
- न्यूनतम २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने २०८८ लाभग्राहीलाई विद्युत महसुल अनुदान प्रदान
- समुदायस्तरबाट सञ्चालित १३ वटा लघु प्रकृतिका लिफ्ट खानेपानी आयोजना २५ प्रतिशत महसुल अनुदान प्रदान
- एकिकृत घुम्ति शिविर कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण वडाहरुका एकिकृत सेवा प्रदान गर्ने परिपाटिको थालनी गरिएको ।

नगरस्तरीय प्रथम मेयरकप रनिङ्ग शिल्ड लगायतका खेल प्रतियोगिता संचालन गरी नगरलाई खेलमय बनाइएको



तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समिति निर्वाचन कार्य सम्पन्न गरी पूर्वाधारमा समेत
सहयोग गरिएको : सुख्खा क्षेत्रलाई पानीमय नगरको रुपमा रुपान्तरण गरिएको



तानसेन खानेपानी उ.स.निर्वाचनको अन्तिम भलक





- राष्ट्रिय भूमि आयोगको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा तानेने नगरपालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको लगत सकलन गरिएका फारमहरू प्रविष्टकार्य सम्पन्न ।

१७०२ जना लाभग्राहीहरूको फारम अपलोड गरिएको ।

यस अन्तर्गत :

भूमिहीन दलित	-१७४
भूमिहीन सुकुम्बासी	-३२४
अव्यवस्थित बसोवासी	-१२०४

विपद व्यवस्थापन

- तानसेन नगर क्षेत्रभित्र रहेका जोखिमपूर्ण जीर्ण रुखहरुका हाँगाहरु कटान
- मनसुन जन्य विपतबाट प्रभावित निजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान (१५ घरधुरीले पहिलो किस्ता पाईसकेको)
- आगलागी तथा हावाहुरीबाट प्रभावित घरधुरीको निवेदन संख्या ११ मध्ये रकम ५ को लागि रकम उपलब्ध गराइएको
- पहिरोबाट प्रभावित घरधुरीको निवेदन संख्या ६ रहेकोमा त्रिपाल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने कार्य जारी रहेको
- विपदको कार्यमा १३५ त्रिपाल वितरण गरिएको ।

२०८१ आषाढ २१ गते देखिको अविरल वर्षातको समयमा गरिएका कार्यहरु

सि. नं.	क्रियाकलाप	एकाइ	परिमाण	अनुमानित रकम	कैफियत
१	नगरपालिकाको ब्याक हो लोडर प्रयोग गरी सडक अवरोध हटाउने कार्यमा सहयोग (करिव २५० लिटर इन्धन प्रयोग)	स्थान	४	४२५००	वडा नं. ३, ५, ११ र १२
२	जनशक्ति परिचालन (वडा अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिहरु, नगर प्रहरी, कर्मचारी, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाहरु)	जना	५१		
३	त्रिपाल वितरण (१५/१८)	थान	५१	७००००	वडा नं. १, २, ३, ३, ५, ६, ९, ११, १२, १३
४	खाद्य सामग्री वितरण तथा आर्थिक सहयोग निरन्तर भैरहेको ।				

दमकल परिचालन गरी नगरपालिका र छिम्पिकी पालिकामा सहयोग (रैनादेवी, रिब्दीकोट, बगनासकाली र माथागढी गा.पा.का प्रभावित क्षेत्रहरु)



Bhagwan Bhandari

48m · 🌐

#खानीगाउ#देउराली माथी।तुरुन्तै रेस्पोन्स गरेर तत्काल दमकल पठाउनु हुने तानसेन नपा प्रशासकिय प्रमुख हरि नागिला उप सचिब दुर्गा थापा प्रहरी स्थानीय सवैलाई धन्यवाद।तत्काल सवै जुटेर धेरै क्षती हुन बाट जोगाइएकोछ। पुर्ण निभाउन प्रयास भने जारी नैछ।



Daya Raj Neupane • Follow

1h · 🌐

खानीगाउ देउरालीमा यति बेला आगो लागि भैरहेको छ । निभाउनी प्रयास जारी छ केही घर जोखिममा रहेका छन ।



Bhagwan Bhandari is with **Manoj Ruchal**.

2 d · 🌐

स्याबास मनोज रुचाल। आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर सयौं मानिसको जीवन र बस्ती बचाएकोमा ल।



DRRM Training



UNDRR- Making City Resilience (MCR2030)

सुशासन तथा संस्थागत विकास

- पाँच वटा विषयगत समिति लगायतका आवश्यकीय समितिहरु क्रियाशील भई नियम र विधि अनुसार विकासमा परिचालन भएको
- स्थानीय आर्थिक विकास (LED) योजना तयारी
- नगर यातायात गुरुयोजना (MTMP) तयारी
- आवधिक योजना निर्माण
- मध्यमकालीन खर्च सम्बन्धी प्रतिवेदन तयारी
- सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई संस्थागत गरिएको

सूचना प्रविधि तर्फ :

- नगरपालिकाको नक्शा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अनलाईन नक्शा पास प्रणाली (Electronic Building Permit System-EBPS) कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
- नगर विकास कोषको प्राविधिक सहयोगमा बनेको एकीकृत नगरसेवा प्रणाली कार्यान्वयनको क्रममा रहेको ।

- नगरका बजार व्यवस्थापनको लागि जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मोनिटरिङ हुनेगरि बजारक्षेत्र र बर्तुंग चोकमा (Automatic Number Plate Reader Camera) गरि १० वटा क्यामरा जडान गरिएको
- पर्यटकीय नगर तानसेनमा यहाँहरुलाई स्वागत र धन्यवाद सहितको नगरको चार सिमाना र बर्तुङ क्षेत्रमा 2D डिजीटल बोर्ड जडान

मुख्य समस्या तथा चुनौति

- ठूला योजना संघ, मझौला योजना प्रदेश र स्थानीय योजना पालिकास्तरबाट हुनु पर्नेमा तालमेल हुन नसेकेको
- संघ र प्रदेशबाट विकास बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय सरकारको माग अनुसार एकद्वार प्रणाली नहुनु
- स्थानीय तहको LMBIS मा प्रविष्टी भएको बजेट समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको जानकारी बिनानै कटौती हुने गरेको (संघबाट ७ प्रतिशत तथा प्रदेशबाट २५ प्रतिशत समानिकरण अनुदान र संघबाट ७ प्रतिशत राजश्व अनुदान कटौति भएको)
- निर्माण व्यवसायिहरुले समयमा काम सम्पन्न नगरिदिँदा ठूला पूर्वाधारका योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहने गरेको
- कतिपय उपभोक्ता समितिहरुले आफूले काम नगरी ठेकेदार मार्फत काम गराउने गरेको

● तानसेन नगरपालिका ●
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
योजना शाखा
बार्षिक कार्ययोजना (आ.व.२०८१/०८२)

क्र.सं.	सञ्चालन गरिने कार्यक्रम/सेवा	स्थान	दिन/ बार/समय	लक्षित सेवाग्राही/संख्या	मुख्य जिम्मेवार कर्मचारी
क-	योजना व्यवस्थापन तर्फ				
१	बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठिको आयोजना	तानसेन नगरपालिका	भाद्र दास्रो हप्ता	नगर का-पा-को कार्यालय, वडा कार्यालय, (का-पा-पदाधिकारी, शाखा प्रमुख, सम्बन्धित कर्मचारी)	योजना शाखा
२	उपभोक्ता समिति गठनको लागि मार्ग दर्शन तयारी र पत्राचार	तानसेन नगरपालिका	भाद्र तेस्रो हप्ता सम्म	१४ वटा वडाहरू	योजना शाखा
३	उपभोक्ता समितिहरूलाई वडागत तालिम	वडास्तर	भाद्र चौथो हप्ता देखि आश्विन दोस्रो हप्तासम्म	४०० उपभोक्ता समिति	योजना, पूर्वाधार, आ-प्र-शाखा
४	योजना सम्झौता	नपा, वडास्तर	आश्विन तेस्रो हप्ता देखि	लाभग्रामी उपभोक्ता	पूर्वाधार, योजना शाखा
५	योजना अनुगमन	तानसेन नगरपालिका	आवश्यकतानुसार	उस, निर्माण व्यवसायी	योजना अनुगमन समिति
ख-	विपद व्यवस्थापन तर्फ				
१	सचेतनाका कार्यक्रमहरू संचालन (आगलागी, बाढी पहिरो, भूक्षय, भूकम्प, हावाहुरी, सवारी दुर्घटना)	ता.न.पा.तथा वडास्तर	पहिलो त्रैमासिक	सम्बन्धित सरोकारवाला र लाभग्राही	स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति
२	विपद सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान तथा नक्शांकन (Hazard Mapping)	ता.न.पा.तथा वडास्तर	दास्रो त्रैमासिक	" " " "	" " " "
३	विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना	ता.न.पा.तथा वडास्तर	दास्रो त्रैमासिक	" " " "	" " " "

तयार गर्ने :

कार्यालय प्रमुख :

तानसेन नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार विकास शाखा
बार्षिककार्ययोजना
आब २०८१/०८२

योजना	बिनियोजन बजेट	स्थान	समय			खरीद प्रक्रिया
			लागत अनुमान तयार गर्ने, सुचना प्रकाशित	सम्झौता गर्ने	सम्पन्न गर्ने	
संघीय समपुरक (योजना संख्या २ वटा)	३४,०००,०००.००	ता. न. पा.	२०८१ असोज १५	२०८१ कार्तिक मसान्त	२०८२ बैशाख मसान्त	बोलपत्र
संघीय विशेष (योजना संख्या १ वटा)	१५,५००,०००.००	ता. न. पा.	२०८२ असोज १५	२०८१ कार्तिक मसान्त	२०८२ बैशाख मसान्त	बोलपत्र
संघीय ससर्त अनुदान कार्यक्रम (योजना संख्या १२ वटा)	४१,६००,०००.००	ता. न. पा.	२०८३ असोज १५	२०८१ कार्तिक मसान्त	२०८२ बैशाख मसान्त	बोलपत्र
प्रदेश समपुरक (योजना संख्या २ वटा)	२१,०००,०००.००	ता. न. पा.	२०८४ असोज १५	२०८१ कार्तिक मसान्त	२०८२ बैशाख मसान्त	बोलपत्र
प्रदेश ससर्त कार्यक्रम (योजना संख्या ४ वटा)	१४,५००,०००.००	ता. न. पा.	२०८५ असोज १५	२०८१ कार्तिक मसान्त	२०८२ बैशाख मसान्त	बोलपत्र
नगरस्तरीय पूर्वाधार विकास (योजना संख्या २८ वटा)	५४,९००,०००.००	ता. न. पा.	२०८१ कार्तिक १५	२०८१ मङ्सिर मसान्त	२०८२ बैशाख मसान्त	बोलपत्र

जिज्ञासा ?

धन्यवाद ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन सूचक अन्तर्गतको प्रगति

नेपाल सरकारबाट आ.व २०८१/८२को लागि
उपलब्ध गराईने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत
कार्यसम्पादन मुल्यांकन वापत प्रदान गरिने अनुदानको
कार्यसम्पादन सूचक वापत प्राप्त गरेको अंक
६२.१० रहेको छ ।

वेरुजुको अद्यावधिक विवरण

आ.व.	असुल गर्नुपर्ने	नियमीत गर्नुपर्ने	पेशकी	जम्मा वेरूजू	फर्छ्यौट भएको	फर्छ्यौट हुन वाँकी	कैफियत
२०७५/०७६	३४८८६७०.१	१५९१०६३०४	१३२३२०००	१७५८२६९७४	१३३३१५५४०	४२५११४३४.५	३४३२७००० आ.व. २०७५/०७६ भन्दा अगाडिको वेरूजू
०७६/०७७	१४५८९१७३	१०६४२२८२५	१०४६१६०	१२२०५८१५८	२००२८३११	१०२०२९८४७	
०७७/०७८	३५२४०६६	६३३९१७५५	२६१७१९२	६९५३३०१३		६९५३३०१३.३	
२०७८/०७९	८९५००००	६२२४५०००	३४७०००	७१५४२०००	५२५६६१	७१०१६३३९	प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर जवाफ पेश भएको रकम १४८६२२१.१
२०७९/०८०	८६७५०००	२१३८२०००	१७६०००	३०२३३०००			
			कुल जम्मा	४३८९६०१४५	१५३८६९५१२	२८५०९०६३४	
नगरसभा मार्फत नियमीत गर्नको लागि तयार गरिएको						६८८५२५४६	
यस आ.व. मा असुल भएको जम्मा रकम						४२४८२०	
संपरिक्षणको लागि तयार कागजात						६९५१०५	
यस पश्चात वाँकी हुने कुल जम्मा वेरूजू						२१५११८१६३	
आ.व.२०७९।०८० को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएको वेरूजू रकम						३०४२३१८०	
कुल जम्मा वेरूजू						२४५५४१३४३	
